

Información Compresor

Número de Serie	Gardner Denver	tornillo	440	300
	Marca	Tipo	Voltaje	HP

Informacion del Cliente

Linamar De México	1017	XAXX010101000
Nombre	Número de Cliente	RFC

Gasto USD*

\$501.41

kWh Utilizados


2949 kWh

Horas Trabajadas


23.9 h

Hp Equivalente: 0 Hp


Hp Instalado: 300 Hp

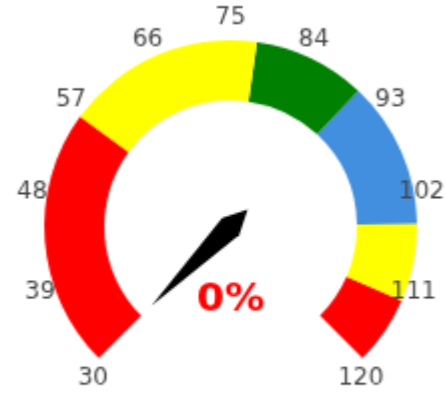

Corriente consumida en el día

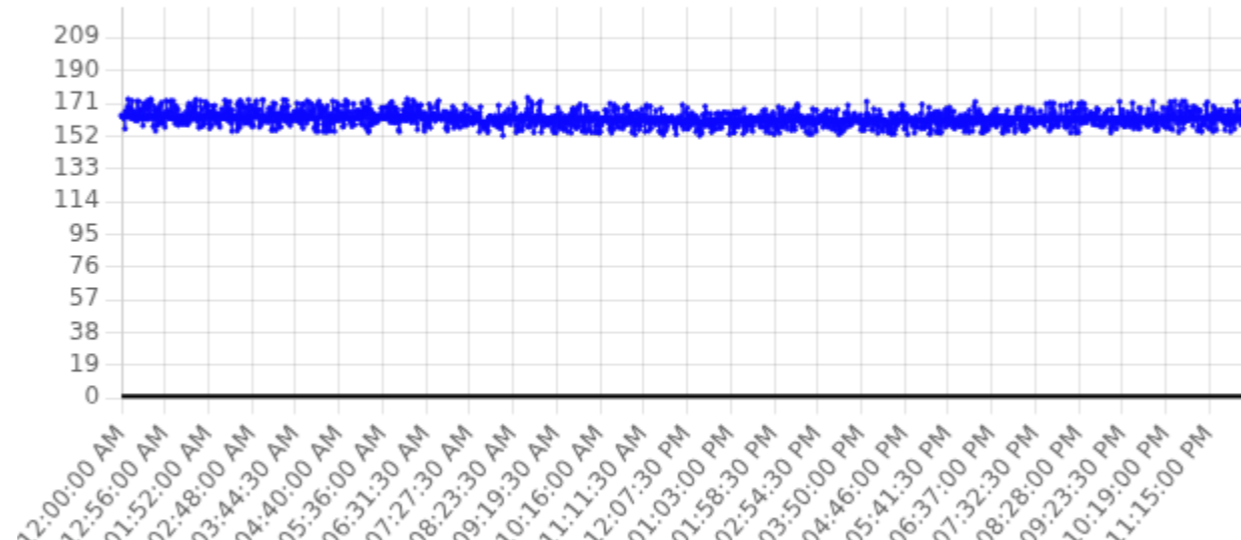

Estados del Compresor

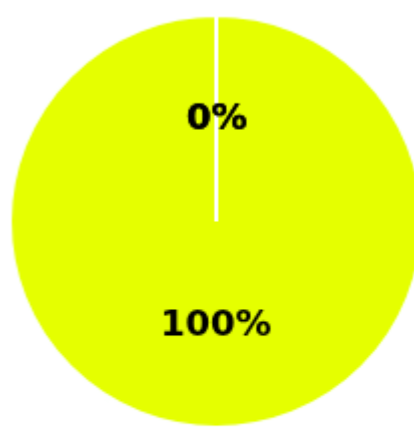

LOAD

NO LOAD

OFF

Comentarios

- El día de ayer (**09/06/2025**) se iniciaron labores a las **00:00:00** y se concluyeron a las **23:59:30**
- Entre las horas de **00:00:00** y **23:59:30**, el compresor operó de la siguiente manera:
 - LOAD:** 0%
 - NO LOAD:** 100%
 - OFF:** 0%
- Durante el día se completaron un total de **0** ciclos de trabajo. Un ciclo se define como un cambio desde el estado **LOAD** a **NO LOAD** consecutivamente.
- El promedio de ciclos por hora trabajada fue de **0** ciclos/hora.
- El costo total de operación del compresor fue de **\$501.41**.
- El promedio de ciclos por hora trabajada está fuera del rango recomendado de 6 a 15 ciclos/hora. Se recomienda realizar un análisis en el compresor para identificar posibles anomalías.
- No se detectaron consumos con valores fuera de lo común.
- El HP Equivalente es mucho menor que el HP nominal del compresor, lo que sugiere que la demanda podría aumentarse para mejorar la eficiencia.
- El costo por kilovatio-hora (kWh) utilizado en este análisis es de **\$0.17 USD/kWh**, que es el estándar actualmente aplicado. Sin embargo, si requiere confirmar este valor o necesita ajustar la tarifa, puede verificar con su contacto en **VENTOLOGIX**

IQgineer VENTOLOGIX asignado:

Nombre: Ing. Andrés Mirazo
Teléfono: 81 8477 7023
Correo: Andres.Mirazo@ventologix.com
